



MANO A MANO BOLIVIA

Voluntariado de apoyo a la salud y desarrollo social

PROYECTO SALUD: JATUN MAYU

DATOS GENERALES :

Infraestructura : Salud
Departamento : Chuquisaca
Provincia : Zudáñez

Municipio : Icla
Distancia : 540 km.
Hrs. viaje : 9 Hrs.

Población : 780 Hab.
Área de Influencia : 780 Hab.

PROYECTO EN EJECUCION :

- Centro de Salud (240,00 m2)

FINANCIAMIENTO :

- Alcaldía de Icla
- Clubes Rotarios Duluth
- Mano a Mano Bolivia
- Mano a Mano International Partners (Patrocinador)

PARTICIPACION :

- Comunidad de Jatun Mayu

PROCESO CONSTRUCCION :

Fecha Inicio: 05/12/2017
Jornales Programados : 111 Jornales
No. Albañiles asignados : 4 Albañiles
No. Peones asignados : 4 Peones
Porcentaje de avance : 20 %
Fecha de Informe : Febrero / 2018

INFORME GRAFICO DESCRIPTIVO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO



1. TRABAJOS INICIALES:

Jatun Mayu, comunidad del municipio de Icla perteneciente a la provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca, basada su economía en la agricultura y la crianza de animales domésticos en pequeña escala. En esta comunidad se realizara la construcción de un centro de salud, los trabajos de construcción inician durante la primera semana del mes de diciembre, comenzando con el traslado de los materiales hasta la comunidad, ahí nos aguarda la gente para poder descargar todo el material de construcción. Entre tanto el personal de Mano a Mano Bolivia realiza el emplazamiento de los planos de fundación y las zapatas. Posteriormente se trabaja con la excavación de los mismos con la comunidad.





MANO A MANO BOLIVIA

Voluntariado de apoyo a la salud y desarrollo social



2. FUNDACIONES – ZAPATAS – VIGA DE ARRIOSTRE:

Una vez culminada la excavación se plantan los fierros de las zapatas juntamente con los de las columnas, para luego vaciar el concreto en las zapatas y los cimientos. Posterior a eso se preparan los encofrados para las vigas de arriostre y los sobre cimientos, vaciando también el concreto en ellos.



3. TRABAJOS EN COLUMNAS (ENCOFRADOS Y VACIADO):

Armados los encofrados de las columnas se vacía también en ellos el concreto dejando que actúe el proceso de fraguado del mismo, para que al día siguiente retirar el encofrado procediendo con el pulido de inmediato dándole el acabado requerido para aplicar la pintura.




4. TRABAJOS DE LADRILLO EN MUROS:

Terminando el vaciado de concreto en las columnas, se procede con la impermeabilización del sobre cimiento para iniciar los trabajos de ladrillo en los muros, este proceso es de bastante detalle, es así que el avance es más lento en relación a los demás ítems a esto se suma el clima de la zona que continuamente se presenta con lluvia esporádica en cualquier momento impidiendo el avance.



MANO A MANO BOLIVIA

Voluntariado de apoyo a la salud y desarrollo social

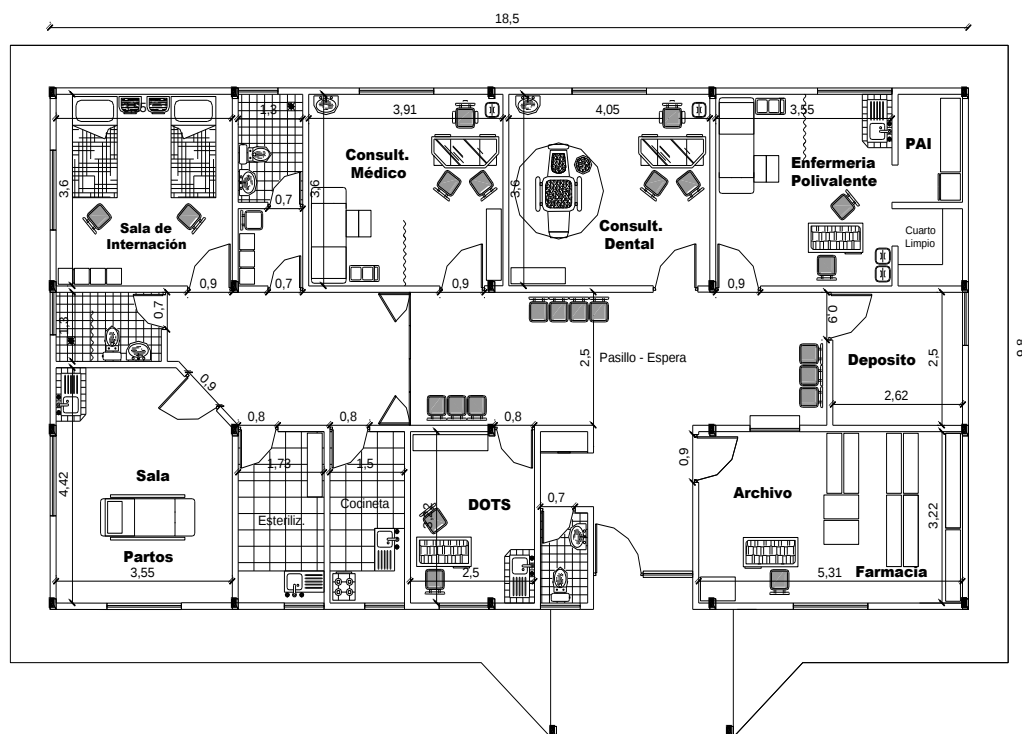

5. PLANO TIPO :

Plano funcional de la construcción, sobre una superficie de 240,00 m2.
